



# LAPORAN KEGIATAN

## PENILAIAN CEPAT SISTEM PASAR DAN TANGGAP DARURAT PASCA BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI SULAWESI TENGAH

Desa Jono, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah

**kerk  
in actie**



**PENABULU ALLIANCE**  
STRENGTHENING INDONESIA CIVIL SOCIETY

1 Oktober 2018 - 30 April 2019  
Nomor Program: 17.0323/009




COOPERATION >

kerk  
in actie

## LAPORAN KEGIATAN

**PENILAIAN CEPAT SISTEM PASAR DAN TANGGAP DARURAT PASCA BENCANA GEMPA BUMI  
DAN TSUNAMI SULAWESI TENGAH**

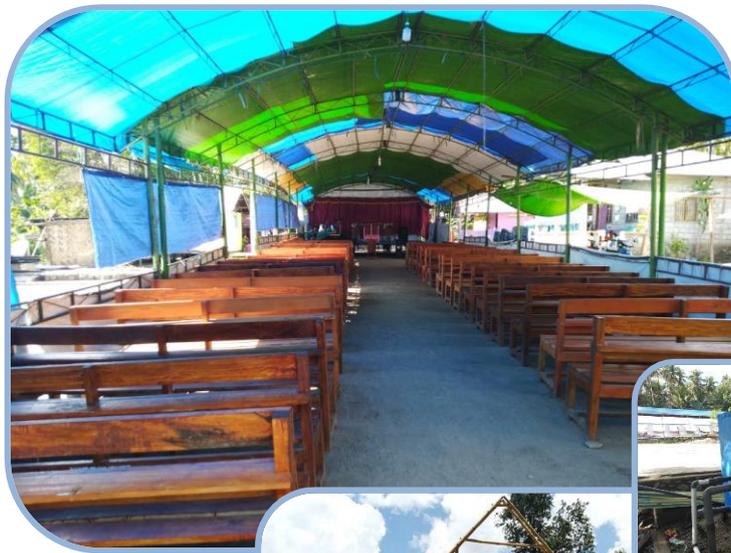

Lokasi:

Desa Jono, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah

Disusun Oleh:

**PENABULU**  **ALLIANCE**  
STRENGTHENING INDONESIA CIVIL SOCIETY

## RINGKASAN PROGRAM

<b>Name of Giro555 Campaign</b>	"Help Slachtoffers Sulawesi"
<b>Periode Pelaporan</b>	1 Oktober 2018 – 30 April 2019
<b>Nomor Proyek</b>	17.0323/009
<b>Nama Organisasi</b>	Penabulu Alliance

### Kemajuan Program

#### **1. Rapid Analisis Market System**

Kegiatan analisis sistem pasar di Kecamatan Dolo Selatan dimulai pada tanggal 8 Desember 2018. Program telah melakukan identifikasi situasi rantai pasok komoditas penting pasca bencana yang berfokus pada kebutuhan pangan rumah tangga, shalter dan komoditas lokal.

Program telah mengidentifikasi situasi di Pasar Rogo, Baluase Dan Sambo, dimana pasar tersebut merupakan pasar berskala kecamatan yang menyediakan kebutuhan bagi masyarakat 12 desa di Kecamatan Dolo Selatan (khususnya Desa Jono dimana merupakan desa intervensi Program). Selain itu, Program juga telah mengidentifikasi pasar diluar Kecamatan sasaran, diantaranya Pasar Bobo yang berada di Kecamatan Dolo Barat dan Pasar Maranatha di Kecamatan Sigi Biromaru. Semua pasar tersebut merupakan pasar mingguan dan kondisi terkini telah beroperasi secara normal baik dari sisi pasokan barang maupun transaksi jual beli.

Berbasis alat *Rapid Assessment of Markets* (RAM), data primer dikumpulkan mengacu pada keberadaan pedagang ditingkat lokal desa dan kecamatan diantaranya kelompok supplai, pedagang eceran, grosir, distributor lokal dan informan kunci lainnya.

#### **2. Emergency Response**

Capaian kegiatan Per April 2019, diantaranya:

a) **Tersedianya data dan informasi profil Desa Boladangko.**

b) **Sector Shelters & Worship Place:**

- Terbangunnya 15 kerangka huntara di dusun 1, 2, dan 3. *(15 KK, 57 jiwa)*
- Terdistribusinya 45 unit kursi kayu dan 1 unit speaker di gereja Bala keselamatan. *(152 KK, 504 jiwa)*
- Terdistribusinya 49 paket peralatan listrik di dusun 1, 2, dan 3. *(49 KK, 138 jiwa)*
- Terbangunnya 36 kerangka huntara di dusun 1, 2, dan 3. *(36 KK, 127 jiwa)*

c) **Sector Water and Sanitation:**

- Terbangunnya 3 ruang MCK komunal di Dusun 3. *(10 KK, 37 jiwa)*
- Terbangunnya 3 ruang MCK di dusun 1. *(6 KK, 22 jiwa)*
- Terbangunnya 9 ruang MCK di dusun 2. *(22 KK, 76 jiwa)*
- Terbangunnya 2 bak penampungan air bersih di dusun 1 dan terinstalasinya pipa air dari bak penampungan ke pemukiman di dusun 1 dan 2. *(160 KK, 536 jiwa)*

d) **Sektor Child protection (Non Food Item for Children):**

- *On Process*

Pembangunan ruang belajar dan bermain ramah anak sebanyak 3 ruang di Dusun 1 RT 3 telah mencapai 40%. (62 jiwa)

- *On Process*

Perencanaan pendistribusian perlengkapan belajar (*study kit*). (50 jiwa)

e) **Sektor Nutrition:**

- *On Process*

Perencanaan pendistribusian makanan bergizi untuk anak umur 1-8 tahun. (50 jiwa)

### Tantangan dan Batasan

Situasi saat ini mengenai tahapan penanganan gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Palu, Donggala dan Sigi dan Parigi Montong masuk dalam tahapan transisi dari tanggap darurat ke tahap pemulihan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur No. 466/425/BPBD/2018, periode transisi ini berlangsung selama 60 hari di mulai dari tanggal 26 Oktober 2016. Kemudian diperpanjang dengan Surat Keputusan Gubernur No.360/509/BPBD-G-3T/2018 tentang perpanjangan status transisi darurat ke pemulihan bencana selama 60 hari terhitung sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019. (*Waktu berjalannya Program Palu Relief Penabulu-ICCO bersamaan dengan keluarnya SK Gubernur tentang tahap transisi pemulihan*).

Tantangan di Desa Jono:

1. Masyarakat terdampak di Desa Jono memperlihatkan pola pergeseran dari posko darurat (komunal) berangsur kembali ke tapak rumah mereka. Sebagian masyarakat terdampak mulai menyiapkan dan membangun hunian sementara (*huntara*) di sekitar tapak rumahnya yang sudah rusak. Berdasarkan kondisi tersebut, usulan Program Relief ICCO-Penabulu mengenai intervensi bantuan tanggap darurat berbasis komunal sudah tidak sesuai lagi untuk dilakukan. Program akan merubah intervensi bantuan dari kegiatan yang berbasis komunal menjadi berbasis kepala keluarga. (pembangunan hunian sementara, pipanisasi air bersih, fasilitas gereja dan RPTRA).
2. Proses pembangunan hunian sementara, ICCO-Penabulu melakukan koordinasi dan bersinergi dengan CWS. Pada saat koordinasi awal telah disepakati ICCO-Penabulu menyediakan kerangka hunian sementara sedangkan CWS menyediakan atap, dinding dan lantai. Pada saat implementasi terjadi perubahan secara sepihak dimana CWS merubah intervensi yaitu membangun full hunian sementara. Hal ini menyebabkan kebingungan antara ICCO-Penabulu dan pemerintah desa terkait data menerima manfaat. Melihat kondisi tersebut ICCO-Penabulu melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan *Habitat For Humanity* untuk bersinergi dalam pembangunan hunian sementara. Disepakati ICCO-Penabulu tetap menyediakan kerangka dan *Habitat For Humanity* menyediakan atap, dinding dan lantai dengan penerima manfaat yang sudah disepakati sebelumnya.

3. Terdapat lembaga bantuan yang masuk ke Desa Jono membawa konsep pemberian upah kerja dalam pemulihan desa. Pemberian upah kerja berdampak pada rusaknya sistem gotong royong yang selama ini terbangun di Desa Jono. Maka Program melakukan koordinasi dengan pihak lembaga terkait, menjelaskan karakteristik masyarakat desa bertujuan agar lembaga terkait tidak menggunakan sistem upah di Desa Jono.
4. Tantangan di Desa Jono: Masih terdapatnya lembaga bantuan yang masuk ke Desa Jono (CWS, YEU) dengan membawa konsep pemberian upah kerja dalam pemulihan desa, berdampak pada rusaknya sistem gotong royong di desa Jono. Menghadapi kondisi ini, Program Palu Relief melakukan koordinasi kepada pemerintah desa dan tokoh-tokoh masyarakat desa Jono sehingga masyarakat dapat membagi waktu untuk melakukan gotong royong dalam melaksanakan pembangunan Program Palu Relief

### Kelanjutan program

Kegiatan program di periode April-September 2019, diantaranya:

- a) Kegiatan pemulihan mata pencaharian masyarakat
- b) Upaya Mitigasi Bencana

### Cerita *Human Interest* (Desa Jono)

Desa Jono, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi

#### **AIR BERSIH SAMPAI KE HUNTARA**

*"Kami sangat bersyukur dengan apa yang lembaga bantuan berikan kepada kami, khususnya PENABULU yang sudah cukup lama menemani kami disini, yang telah membantu membangun MCK, perbaikan pipa air dan bak permanen distribusi air bersih. Saat ini kami sudah senang, air bersih sudah terpenuhi sampai ke Huntara Kami, kalau mau buang air dan mandi tidak perlu lagi kesungai karena sudah banyak MCK. Kami sangat terbantu sekali, khususnya ibu-ibu dan anak-anak perempuan tidak lagi mandi atau buang air di sungai. Tidak seperti sebelum bencana dimana mayoritas masyarakat kalau membuang air besar dan mandi selalu ke sungai",* tutur Hezron sebagai Kepala dusun 1 Desa Jono.



Pipanisasi di huntara desa Jono

Keberadaan MCK dan ketersediaan air bersih menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa Jono, terutama sejak terjadinya bencana gempa. Bahkan sebelum bencana terjadi, warga desa Jono masih memiliki kebiasaan untuk menggunakan sungai sebagai sarana untuk melakukan aktifitas mandi, cuci, dan kakus. Kondisi ini dapat berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Namun, saat ini, dengan banyaknya bantuan berupa pembangunan MCK dan pengadaan air sampai ke huntara masing-masing warga, maka warga desa Jono tidak perlu lagi ke sungai untuk melakukan aktifitas mandi, cuci, dan kakus. Kini mereka tidak perlu khawatir akan kekurangan air di masing-masing huntara.

**Dokumentasi Kegiatan Relief KIA-ICCO-Penabulu di Desa Jono:**



Proses pembangunan hunian sementara di dusun 1



Hunian sementara di dusun 1



Proses pembangunan MCK Komunal di dusun 2



MCK Komunal di dusun 2



Proses pembangunan ruang ramah anak di dusun 1



Proses pemasangan pipa air di dusun 2



Pipa air terpasang di dusun 2

## Capaian Kegiatan Program Relief ICCO-Penabulu

**Tabel 16.** Capaian kegiatan program Relief ICCO-Penabulu di Desa Jono, Kecamatan Dolo Selatan

No	Program ICCO-Penabulu	Jenis Bantuan	Capaian Program Triwulan 1	Jumlah Penerima Manfaat	Rencana Program Triwulan 2	Jumlah Penerima Manfaat
1.	<b>Hunian Sementara</b>	<b>Kerangka bangunan</b> <i>(51 Unit hunian sementara)</i>	Rincian pembangunan kerangka hunian sementara per desember 2018: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbangunnya 7 kerangka huntara di dusun 1</li> <li>• Terbangunnya 6 kerangka huntara di dusun 2</li> <li>• Terbangunnya 2 kerangka huntara di dusun 3</li> </ul>	15 KK (57 jiwa)	Rincian pembangunan kerangka hunian sementara per April 2019: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbangunnya 18 kerangka huntara di dusun 1</li> <li>• Terbangunnya 8 kerangka huntara di dusun 2</li> <li>• Terbangunnya 10 kerangka huntara di dusun 3</li> </ul>	36 KK (127 jiwa)
		<b>Paket penerangan dan instalasi kabel listrik</b> (49 paket penerangan) <i>Catatan: Penerima paket penerangan bukan penerima kerangka hunian</i>	49 paket penerangan telah didistribusikan ke masyarakat penerima manfaat yang tersebar di dusun 1, dusun 2 dan dusun 3.	49 KK (138 jiwa)	-	-
2	<b>MCK</b>	<b>Bangunan MCK permanen</b> (15 ruang sarana MCK di 5 titik)  <i>catatan: 1 titik terdiri dari 3 ruang (ruang mandi, ruang cuci dan ruang bab)</i>	Terbangunnya 3 ruang sarana MCK, dengan rincian: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Satu titik MCK terbangun di dusun 3 (10 KK, 37 jiwa)</li> </ul>	10 KK (37 jiwa)	Rincian pembangunan 12 ruang sarana MCK per April 2019: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbangunnya 3 ruang MCK di dusun 1 RT 3 (6 KK, 22 jiwa)</li> <li>• Terbangunnya 9 ruang MCK di dusun 2 RT 4 &amp; 5 (22 KK, 76 jiwa)</li> </ul>	28 KK (98 jiwa)
3	<b>Tempat Ibadah</b>	<b>Bangku Gereja dan speaker</b> (kursi kayu 45 unit dan 1 unit speaker)  <i>Catatan: Pengguna Gereja dusun 1 dan dusun 2, Desa Jono</i>	Kursi kayu 45 unit dan 1 unit speaker selesai terdistribusi di Gereja BK Corps Desa Jono	152 KK (504 jiwa)	-	-

4	Air Bersih	Pipanisasi air bersih serta bak penampungan dan distribusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbangunnya dua bak penampungan dan pendistribusian air bersih di dusun 1</li> <li>• 25 batang pipa 2 inch terdistribusi</li> <li>• 25 batang pipa 1 inch terdistribusi</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terinstalasinya pipa dari bak penampungan ke pemukiman di dusun 1 dan dusun 2</li> </ul>	160 KK (536 jiwa)
5	RPTRA	Pembangunan ruang belajar dan bermain ramah anak	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>On Process</i> Proses pembangunan ruang belajar dan bermain ramah anak sebanyak 3 ruang (40%) di dusun 1 RT 3</li> <li>• <i>On Process</i> Perencanaan pendistribusian perlengkapan belajar (<i>study kit</i>) untuk 50 anak</li> <li>• <i>On Process</i> Perencanaan pendistribusian 1 set perlengkapan olahraga sebagai pendukung lapangan olahraga umum di desa dusun 1 RT 2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 62 jiwa</li> <li>• 50 jiwa</li> <li>• 212 KK (429 jiwa)</li> </ul>
6	Gizi dan Kesehatan	Makanan sehat untuk bayi, balita serta ibu hamil dan menyusui	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>On Process</i> Perencanaan pendistribusian makanan bergizi untuk anak umur 1-8 tahun</li> </ul>	50 jiwa

**Lampiran Pendukung:**

**Lampiran 1.** Rincian penerima manfaat fasilitas pendukung ibadah (peralatan gereja sementara)

Lokasi	Koordinat Gereja Sementara		Distribusi	Penerima Manfaat berdasarkan Jenis Kelamin/KK					Penerima Manfaat Detail						
	Lintang	Bujur		Dusun	RT	KK	L	P	Jiwa	KK	Dewasa		Anak		Jiwa
										L	P	L	P		
Dusun 3			Bangku Kayu & Speaker 1	1	1	40	74	61	135	40	53	40	21	21	135
					2	29	53	48	101	29	37	32	16	16	101
					3	29	41	48	89	29	25	28	16	20	89
				2	4	29	42	52	94	29	24	32	18	20	94
					5	25	49	36	85	25	33	26	16	10	85
<b>TOTAL</b>			<b>45 unit bangku kayu &amp; 1 unit speaker</b>	<b>TOTAL</b>	<b>152</b>	<b>259</b>	<b>245</b>	<b>504</b>	<b>152</b>	<b>172</b>	<b>158</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>504</b>	

**Lampiran 2.** Rincian penerima manfaat fasilitas hunian sementara (kerangka hunian sementara)

Lokasi	Koordinat Penerima Manfaat		Distribusi	Penerima Manfaat berdasarkan Jenis Kelamin/KK					Penerima Manfaat Detail						
	Lintang	Bujur		Dusun	RT	KK	L	P	Jiwa	KK	Dewasa		Anak		Jiwa
										L	P	L	P		
Dusun 1,2,3			Kerangka Huntara (25 unit)	1	1	5	11	11	22	5	9	8	2	3	22
					2	10	17	18	35	10	11	11	6	7	35
					3	10	14	18	32	10	10	10	4	8	32
			2	4	7	12	14	26	7	7	9	5	5	26	
				5	7	15	10	25	7	12	6	3	4	25	
			3	6	12	20	24	44	12	13	12	7	12	44	
<b>TOTAL</b>			<b>51 unit kerangka huntara</b>	<b>TOTAL</b>	<b>51</b>	<b>89</b>	<b>95</b>	<b>184</b>	<b>51</b>	<b>62</b>	<b>56</b>	<b>27</b>	<b>39</b>	<b>184</b>	

**Lampiran 3.** Rincian penerima manfaat fasilitas hunian sementara (perlengkapan listrik)

Lokasi	Koordinat Penerima Manfaat		Distribusi	Penerima Manfaat berdasarkan Jenis Kelamin/KK						Penerima Manfaat Detail					
	Lintang	Bujur		Dusun	RT	KK	L	P	Jiwa	KK	Dewasa		Anak		Jiwa
											L	P	L	P	
Dusun 1,2,3			Perlengkapan Listrik (36 paket)	1	1	18	31	18	49	18	20	14	11	4	49
					2	6	12	12	24	6	10	7	2	5	24
					3	12	15	14	29	12	10	12	5	2	29
			Perlengkapan Listrik (10 paket)	2	4	6	9	10	19	6	6	7	3	3	19
					5	4	6	5	11	4	3	4	3	1	11
			Perlengkapan Listrik (3 paket)	3	6	3	3	3	6	3	2	2	1	1	6
<b>TOTAL</b>			<b>49 paket perlengkapan listrik</b>	<b>TOTAL</b>	<b>49</b>	<b>76</b>	<b>62</b>	<b>138</b>	<b>49</b>	<b>51</b>	<b>46</b>	<b>25</b>	<b>16</b>	<b>138</b>	

**Lampiran 4.** Rincian penerima manfaat fasilitas MCK (Latrine)

Lokasi	Koordinat Penerima Manfaat		Distribusi	Penerima Manfaat berdasarkan Jenis Kelamin/KK						Penerima Manfaat Detail					
	Lintang	Bujur		Dusun	RT	KK	L	P	Jiwa	KK	Dewasa		Anak		Jiwa
											L	P	L	P	
Dusun 1 RT 3	01°06'42.3"	119°52'26.1"	MCK Komunal (Latrine) (3 ruang)	1	3	6	9	13	22	6	7	8	2	5	22
Dusun 2 RT 4	01°06'39.7"	119°52'28.0"	MCK Komunal (Latrine) (3 ruang)	2	4	4	7	8	15	4	4	6	3	2	15
Dusun 2 RT 4	01°06'42.0"	119°52'26.6"	MCK Komunal (Latrine) (3 ruang)	2	4	10	15	18	33	10	10	11	5	7	33
Dusun 2 RT 5	01°06'36.1"	119°52'26.8"	MCK Komunal (Latrine) (3 ruang)	2	5	8	15	13	28	8	11	10	4	3	28
Dusun 3 RT 6	01°06'06.1"	119°52'18.2"	MCK Komunal (Latrine) (3 ruang)	3	6	10	22	15	37	10	14	9	8	6	37
<b>TOTAL</b>			<b>15 ruang MCK komunal (Latrine)</b>	<b>TOTAL</b>	<b>38</b>	<b>68</b>	<b>67</b>	<b>135</b>	<b>38</b>	<b>46</b>	<b>44</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>135</b>	

**Lampiran 5.** Rincian penerima manfaat air bersih

Lokasi	Koordinat Penerima Manfaat		Distribusi	Penerima Manfaat berdasarkan Jenis Kelamin/KK						Penerima Manfaat Detail					
	Lintang	Bujur		Dusun	RT	KK	L	P	Jiwa	KK	Dewasa		Anak		Jiwa
											L	P	L	P	
Dusun 1 RT 1	01°06'47.8"	119°52'14.8"	Bak Penampungan Air Bersih	1	1	40	74	61	135	40	53	40	21	21	135
Dusun 1 RT 2	01°06'45.5"	119°52'19.9"	Bak Penampungan Air Bersih	1	2	29	53	48	101	29	37	32	16	16	101
				1	3	29	41	48	89	29	25	28	16	20	89
				2	4	34	53	61	114	34	35	37	18	24	114
				2	5	28	56	41	97	28	38	30	18	11	97
<b>TOTAL</b>			<b>2 unit bak penampungan air bersih</b>	<b>TOTAL</b>		<b>160</b>	<b>277</b>	<b>259</b>	<b>536</b>	<b>160</b>	<b>188</b>	<b>167</b>	<b>89</b>	<b>92</b>	<b>536</b>

**Lampiran 6.** Rincian penerima manfaat fasilitas Ruang Ramah Anak

Lokasi	Koordinat Penerima Manfaat		Distribusi	Penerima Manfaat berdasarkan Jenis Kelamin/KK						Penerima Manfaat Detail					
	Lintang	Bujur		Dusun	RT	KK	L	P	Jiwa	KK	Dewasa		Anak		Jiwa
											L	P	L	P	
Dusun 1 RT 3			Bangunan Semi Permanen	1	1		3	4	7			1	3	3	7
					2		6	6	12			3	6	3	12
					3		4	6	10			3	4	3	10
				2	4		6	7	13			2	6	5	13
					5		6	5	11			3	5	3	11
				3	6		4	4	8				4	4	8
										1	1			1	
<b>TOTAL</b>			<b>3 ruangan Ruang Ramah Anak</b>	<b>TOTAL</b>			<b>29</b>	<b>33</b>	<b>62</b>			<b>13</b>	<b>28</b>	<b>21</b>	<b>62</b>
